

國立中山大學工程竣工查驗紀錄

查驗時間：115 年 2 月 11 日上午 10 時 00 分

查驗地點：電資大樓北側廁所 5 樓至 9 樓

採購案號	1140527
工程名稱	電資大樓廁所(3 樓及 5 樓至 9 樓)整建修繕統包工程
查驗項目	一、假設拆除工程 二、五樓男廁 三、六樓男女廁 四、七樓男廁 五、八樓男女廁 六、九樓男廁 七、頂樓
承攬廠商	貓走路室內裝修有限公司
履約期限	第一階段：限定 114 年 11 月 3 日開工，並於 115 年 3 月 3 日竣工(展延工期 1 日)
實際竣工日期	115 年 2 月 9 日
查驗結果	經會同承包商貓走路室內裝修有限公司及監造單位庭張文欽建築師事務所於電資大樓北側廁所 5 樓至 9 樓現場進行竣工查驗，經查驗結果確認完工符合規定，擬依約辦理驗收作業。

查驗紀錄	一、假設拆除工程
	1. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長 120x 寬 75cm
	二、五樓男廁(工 EC5030 男廁)
	1. 砌紅磚，紅磚，1/2B
	2. 蹲便位置加高
	3. 鋪貼壁磚，300x600mm
	4. 地面鋪貼磁磚 30*30cm 含花磚
	5. 坐式馬桶，落地式，含配件
	6. 新設加長型蹲式馬桶配件全
	7. 小便器，掛牆式，電動沖水閥，含配件
	8. 馬槽型人造石洗手台(下方安裝水龍頭)
	9. 拖布盆，陶瓷，含配件
	10. 無障礙小便斗扶手
	11. 自動龍頭
	12. 給皂機，自動式
	13. 新設搗擺
	14. 衛生設備安裝及配線(含工資)
	15. 新設鋁製框架+8mm 膠合玻璃隔間
	16. 浴廁強化美耐板隔間，小便斗隔板
	17. 廁間衣物掛勾
	18. 鋁窗外新設固展鋁花格網
	19. 下層既有天花板拆卸、清潔及復原
	20. T5-LED 層板燈+軌道燈
	21. 入口處壁燈
	22. 排風扇
	23. 嵌入單切開關
	24. 接地型雙聯插座(附防滴蓋板)
	25. 新設緊急求救鈴按鈕
	26. 新設明鏡
	27. 標示牌(LED 壓克力燈)
	28. 門片標示牌(卡點西德)
	29. 美耐板置物高櫃
	30. 壁磚以上壁面及天花板水泥漆處理
	31. 吊管清潔口 4"
	32. 不銹鋼排水口
	33. 更換樓層閥門
	34. 管道間蓋板更新(塑鋼門)

查驗紀錄

三、六樓男廁(工 EC6034 男廁)

1. 砌紅磚，紅磚，1/2B
2. 蹲便位置加高
3. 鋪貼壁磚，300x600mm
4. 鋪地磚，300x300mm
5. 地坪水泥砂漿打底振石子
6. 坐式馬桶，落地式，含配件
7. 新設加長型蹲式馬桶配件全
8. 馬槽型人造石洗手台(下方安裝水龍頭)
9. 拖布盆，陶瓷，含配件
10. 無障礙小便斗扶手
11. 自動龍頭
12. 給皂機，自動式
13. 大捲筒衛生紙架
14. 小便器，掛牆式，電動沖水閥，含配件
15. 沖洗器
16. 衛生設備安裝及配線(含工資)
17. 新設搗擺隔間(含安裝固定)
18. 浴廁強化美耐板隔間，小便斗隔板
19. 廁間增加置物板(25*25cm 半圓)
20. 廁間衣物掛勾
21. 鋁窗外新設固展鋁花格網
22. 天花板，明架，矽酸鈣板，輕鋼架
23. 照明燈具-15w 以上 LED 嵌燈(15cm)
24. 排風扇
25. 輕鋼架循環扇
26. 嵌入單切開關
27. 接地型雙聯插座(附防滴蓋板)
28. 新設緊急求救鈴按鈕
29. 新設明鏡
30. 門片標示牌(卡點西德)
31. 吊管清潔口 4"
32. 不銹鋼排水口
33. 更換樓層閥門
34. 管道間蓋板更新(塑鋼門)

查驗紀錄	四、六樓女廁(工 EC6035) 1. 蹲便位置加高 2. 鋪貼壁磚，300x600mm 3. 鋪地磚，300x300mm 4. 地坪水泥砂漿打底抵石子 5. 坐式馬桶，落地式，含配件 6. 新設加長型蹲式馬桶配件全 7. 馬槽型人造石洗手台(下方安裝水龍頭) 8. 拖布盆，陶瓷，含配件 9. 自動龍頭 10. 給皂機，自動式 11. 大捲筒衛生紙架 12. 沖洗器 13. 新設搗擺隔間(含安裝固定) 14. 廁間增加置物板(25*25cm 半圓) 15. 廁間衣物掛勾 16. 置物層板及衛生用品盒 17. 鋁窗外新設固展鋁花格網 18. 天花板，明架，矽酸鈣板，輕鋼架 19. 照明燈具-15w 以上 LED 嵌燈(15cm) 20. 排風扇 21. 輕鋼架循環扇 22. 嵌入單切開關 23. 接地型雙聯插座(附防滴蓋板) 24. 新設緊急求救鈴按鈕 25. 新設明鏡 26. 門片標示牌(卡點西德) 27. 不銹鋼排水口 28. 管道間蓋板更新(塑鋼門)
------	---

查驗紀錄

五、七樓男廁(工 EC7027 男廁)

1. 砌紅磚，紅磚，1/2B
2. 蹲便位置加高
3. 鋪貼壁磚，300x600mm
4. 鋪地磚，300x300mm
5. 地坪水泥砂漿打底抵石子
6. 坐式馬桶，落地式，含配件
7. 新設加長型蹲式馬桶配件全
8. 小便器，掛牆式，電動沖水閥，含配件
9. 馬槽型人造石洗手台(下方安裝水龍頭)
10. 拖布盆，陶瓷，含配件
11. 無障礙小便斗扶手
12. 自動龍頭
13. 給皂機，自動式
14. 大捲筒衛生紙架
15. 沖洗器
16. 新設搗擺隔間(含安裝固定)
17. 浴廁強化美耐板隔間，小便斗隔板
18. 廁間增加置物板(25*25cm 半圓)
19. 廁間衣物掛勾
20. 鋁窗外新設固展鋁花格網
21. 天花板，明架，矽酸鈣板，輕鋼架
22. 照明燈具-15w 以上 LED 嵌燈(15cm)
23. 排風扇
24. 輕鋼架循環扇
25. 嵌入單切開關
26. 接地型雙聯插座(附防滴蓋板)
27. 新設緊急求救鈴按鈕
28. 新設明鏡
29. 門片標示牌(卡點西德)
30. 不銹鋼排水口
31. 管道間蓋板更新(塑鋼門)

查驗紀錄	六、八樓女廁(工 EC8027) 1. 蹲便位置加高 2. 鋪貼壁磚，300x600mm 3. 鋪地磚，300x300mm 4. 地坪水泥砂漿打底振石子 5. 坐式馬桶，落地式，含配件 6. 新設加長型蹲式馬桶配件全 7. 馬槽型人造石洗手台(下方安裝水龍頭) 8. 拖布盆，陶瓷，含配件 9. 自動龍頭 10. 給皂機，自動式 11. 大捲筒衛生紙架 12. 沖洗器 13. 新設搗擺隔間(含安裝固定) 14. 廁間增加置物板(25*25cm 半圓) 15. 廁間衣物掛勾 16. 置物層板及衛生用品盒 17. 鋁窗外新設固展鋁花格網 18. 天花板，明架，矽酸鈣板，輕鋼架 19. 照明燈具-15w 以上 LED 崁燈(15cm) 20. 排風扇 21. 輕鋼架循環扇 22. 崁入單切開關 23. 接地型雙聯插座(附防滴蓋板) 24. 新設緊急求救鈴按鈕 25. 新設明鏡 26. 門片標示牌(卡點西德) 27. 不銹鋼排水口 28. 管道間蓋板更新(塑鋼門)
------	---

查驗紀錄	七、八樓男廁(工 EC8028) 1. 砌紅磚，紅磚，1/2B 2. 蹲便位置加高 3. 鋪貼壁磚，300x600mm 4. 鋪地磚，300x300mm 5. 地坪水泥砂漿打底抵石子 6. 坐式馬桶，落地式，含配件 7. 新設加長型蹲式馬桶配件全 8. 小便器，掛牆式，電動沖水閥，含配件 9. 馬槽型人造石洗手台(下方安裝水龍頭) 10. 拖布盆，陶瓷，含配件 11. 無障礙小便斗扶手 12. 自動龍頭 13. 給皂機，自動式 14. 大捲筒衛生紙架 15. 沖洗器 16. 新設搗擺隔間(含安裝固定) 17. 浴廁強化美耐板隔間，小便斗隔板 18. 廁間增加置物板(25*25cm 半圓) 19. 廁間衣物掛勾 20. 鋁窗外新設固展鋁花格網 21. 天花板，明架，矽酸鈣板，輕鋼架 22. 照明燈具-15w 以上 LED 嵌燈(15cm) 23. 排風扇 24. 輕鋼架循環扇 25. 嵌入單切開關 26. 接地型雙聯插座(附防滴蓋板) 27. 新設緊急求救鈴按鈕 28. 新設明鏡 29. 門片標示牌(卡點西德) 30. 不銹鋼排水口
------	--

查驗紀錄	八、九樓男廁(工 EC9040) 1. 砌紅磚，紅磚，1/2B 2. 蹲便位置加高 3. 鋪貼壁磚，300x600mm 4. 鋪地磚，300x300mm 5. 地坪水泥砂漿打底抵石子 6. 坐式馬桶，落地式，含配件 7. 新設加長型蹲式馬桶配件全 8. 小便器，掛牆式，電動沖水閥，含配件 9. 馬槽型人造石洗手台(下方安裝水龍頭) 10. 拖布盆，陶瓷，含配件 11. 無障礙小便斗扶手 12. 自動龍頭 13. 給皂機，自動式 14. 大捲筒衛生紙架 15. 沖洗器 16. 新設搗擺隔間(含安裝固定) 18. 浴廁強化美耐板隔間，小便斗隔板 19. 廁間增加置物板(25*25cm 半圓) 20. 廁間衣物掛勾 20. 鋁窗外新設固展鋁花格網 22. 天花板，明架，矽酸鈣板，輕鋼架 23. 照明燈具-15w 以上 LED 炭燈(15cm) 24. 排風扇 25. 輕鋼架循環扇 26. 嵌入單切開關 27. 接地型雙聯插座(附防滴蓋板) 28. 新設緊急求救鈴按鈕 29. 新設明鏡 29. 門片標示牌(卡點西德) 31. 不銹鋼排水口 33. 管道間蓋板更新(塑鋼門) 九、頂樓 1. 給水閥更換白鐵止水閥
備註	契約金額：13,699,967 元 第一階段驗收結算金額：6,075,199 元

查驗人員

施工廠商：貓走路室內裝修有限公司

郭如榮 張高曜

監造單位：張文欽建築師事務

張美月

營繕組：

吳昭昇

使用單位：

柳瑛怡

一、假設拆除工程

1. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長 120x 寬 75cm



五樓男廁(工 EC5030 男廁)

1. 砌紅磚，紅磚，1/2B



2. 蹲便位置加高及新設加長型蹲式馬桶
配件全



3. 鋪貼壁磚，300x600mm



4. 地面鋪貼磁磚 30*30cm 含花磚



5. 坐式馬桶，落地式，含配件

6. 小便器，掛牆式，電動沖水閥，含配件
共 4 座及無障礙小便斗扶手



7. 馬槽型人造石洗手台(下方安裝水龍頭)及自動龍頭



9. 拖布盆，陶瓷，含配件



12. 給皂機，自動式及嵌入單切開關及新設緊急求救鈴按鈕



13. 新設搗擺及新設鋁製框架+8mm 膠合玻璃隔間



15. 浴廁強化美耐板隔間，小便斗隔板



16. 廁間衣物掛勾



17. 鋁窗外新設固展鋁花格網

20. T5-LED 層板燈+軌道燈



21. 入口處壁燈



22. 排風扇



24. 接地型雙聯插座(附防滴蓋板)



26. 新設明鏡



27. 標示牌(LED 壓克力燈)



28. 門片標示牌(卡點西德)



29. 美耐板置物高櫃(高 180 公分寬 125 公分)

30. 壁磚以上壁面及天花板水泥漆處理



32. 不銹鋼排水口



33. 管道間蓋板更新(塑鋼門)



六樓男廁(工 EC6034 男廁)

1. 砌紅磚，紅磚，1/2B



2. 蹲便位置加高及新設加長型蹲式馬桶
配件全



3. 鋪貼壁磚，300x600mm



4. 鋪地磚，300x300mm



5. 地坪水泥砂漿打底振石子

6. 坐式馬桶，落地式，含配件及沖洗器及
接地型雙聯插座(附防滴蓋板)




7. 馬槽型人造石洗手台(下方安裝水龍頭)及自動龍頭

8. 拖布盆，陶瓷，含配件



9. 無障礙小便斗扶手及小便器，掛牆式，電動沖水閥，含配件 3 組

10. 給皂機，自動式

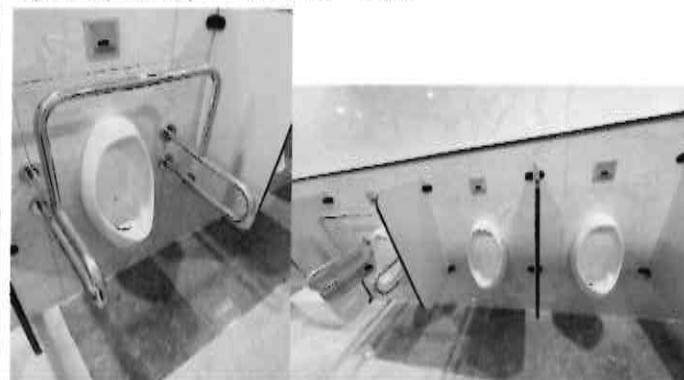

11. 大捲筒衛生紙架 3 組

12. 新設搗擺隔間(含安裝固定)



13. 浴廁強化美耐板隔間，小便斗隔板

14. 廁間增加置物板(25*25cm 半圓)



15. 廁間衣物掛勾



16. 鋁窗外新設固展鋁花格網及天花板，明架，矽酸鈣板，輕鋼架



17. 照明燈具-15w 以上 L ED 炭燈(15cm) 共 6 盞及排風扇 2 組



18. 輕鋼架循環扇共 3 組



19. 嵌入單切開關及新設緊急求救鈴按鈕及新設明鏡



20. 門片標示牌(卡點西德)



21. 不銹鋼排水口



22. 管道間蓋板更新(塑鋼門)



六樓女廁(工 EC6035)

1. 蹲便位置加高



2. 鋪貼壁磚，300x600mm



3. 鋪地磚，300x300mm



4. 地坪水泥砂漿打底抵石子



5. 坐式馬桶，落地式，含配件及沖洗器及廁間增加置物板(25*25cm 半圓) 及新設緊急求救鈴按鈕



6. 新設加長型蹲式馬桶配件全及廁間增加置物板(25*25cm 半圓) 及新設緊急求救鈴按鈕



7. 馬槽型人造石洗手台(下方安裝水龍頭) 及

8. 拖布盆，陶瓷，含配件

自動龍頭及接地型雙聯插座(附防滴蓋板)



9. 給皂機，自動式及大捲筒衛生紙架



10. 新設搗擺隔間(含安裝固定)



11. 廁間衣物掛勾



12. 置物層板及衛生用品盒



13. 鋁窗外新設固展鋁花格網



14. 天花板，明架，矽酸鈣板，輕鋼架及照明燈具-15w 以上LED 崁燈(15cm)及排風扇及輕鋼架循環扇



15. 嵌入單切開關

16. 新設明鏡



17. 門片標示牌(卡點西德)



18. 不銹鋼排水口



十、七樓男廁(工 EC7027 男廁)

1. 砌紅磚，紅磚，1/2 及無障礙小便斗扶手




2. 蹲便位置加高



3. 鋪貼壁磚，300x600mm



4. 鋪地磚，300x300mm

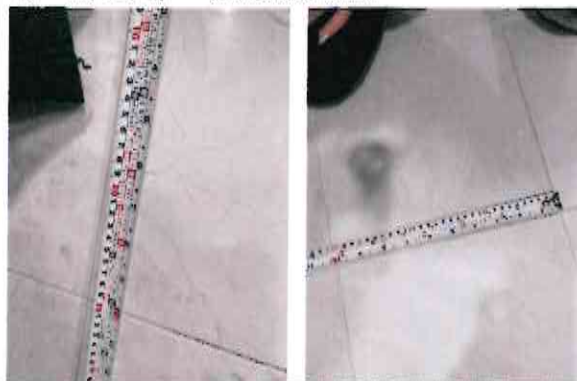

5. 地坪水泥砂漿打底抵石子

6. 坐式馬桶，落地式，含配件及沖洗器廁間及增加置物板(25*25cm 半圓)



7. 新設加長型蹲式馬桶配件全



8. 小便器，掛牆式，電動沖水閥，含配件



9. 馬槽型人造石洗手台(下方安裝水龍頭)及自動龍頭及大捲筒衛生紙架及新設明鏡及新設緊急求救鈴按鈕



10. 拖布盆，陶瓷，含配件及給皂機，自動式



11. 新設搗擺隔間(含安裝固定)及浴廁強化美耐板隔間，小便斗隔板



12. 廁間衣物掛勾



13. 鋁窗外新設圍展鋁花格網及照明燈具-15w 以上 LED 嵌燈(15cm)

14. 天花板，明架，矽酸鈣板，輕鋼架及輕鋼架循環扇及排風扇



15. 嵌入單切開關



16. 接地型雙聯插座(附防滴蓋板)



17. 門片標示牌(卡點西德)



18. 不銹鋼排水口



19. 管道間蓋板更新(塑鋼門)



十一、八樓女廁(工 EC8027)

1. 蹲便位置加高

2. 鋪貼壁磚，300x600mm



3. 鋪地磚，300x300mm

4. 地坪水泥砂漿打底振石子



5. 坐式馬桶，落地式，含配件及沖洗器及廁間增加置物板(25*25cm 半圓)及新設緊急求救鈴按鈕

6. 新設加長型蹲式馬桶配件全廁間增加及置物板(25*25cm 半圓)及新設緊急求救鈴按鈕



7. 馬槽型人造石洗手台(下方安裝水龍頭)及自動龍頭

8. 拖布盆，陶瓷，含配件



9. 給皂機，自動式及大捲筒衛生紙架及嵌入單切開關

10. 新設搗擺隔間(含安裝固定)



11. 廁間衣物掛勾



12. 置物層板及衛生用品盒



13. 鋁窗外新設固展鋁花格網及照明燈具-15w 以上 LED 崁燈(15cm)

14. 天花板，明架，矽酸鈣板，輕鋼架及排風扇及輕鋼架循環扇及門片標示牌(卡點西德)



15. 接地型雙聯插座(附防滴蓋板)

16. 新設明鏡



17. 不銹鋼排水口

18. 管道間蓋板更新(塑鋼門)



八樓男廁(工 EC8028)

1. 砌紅磚，紅磚，1/2B



2. 蹲便位置加高



3. 鋪貼壁磚，300x600mm



4. 鋪地磚，300x300mm



5. 地坪水泥砂漿打底抵石子



6. 坐式馬桶，落地式，含配件及沖洗器及廁間增加置物板(25*25cm 半圓)



7. 新設加長型蹲式馬桶配件全及廁間增加置物板(25*25cm 半圓)

8. 小便器，掛牆式，電動沖水閥，含配件



9. 馬槽型人造石洗手台(下方安裝水龍頭)及自動龍頭及給皂機，自動式及大捲筒衛生紙架



11. 新設搗擺隔間(含安裝固定)



13. 廁間衣物掛勾



10. 拖布盆，陶瓷，含配件及無障礙小便斗扶手



12. 浴廁強化美耐板隔間，小便斗隔板



14. 鋁窗外新設固展鋁花格網



15. 天花板，明架，矽酸鈣板，輕鋼架

16. 照明燈具-15w 以上 LED 嵌燈(15cm)



17. 排風扇及輕鋼架循環扇

18. 嵌入單切開關及接地型雙聯插座(附防滴蓋板) 及新設明鏡



19. 新設緊急求救鈴按鈕

23. 門片標示牌(卡點西德)



九樓男廁(工 EC9040)

1. 砌紅磚，紅磚，1/2B

2. 蹲便位置加高



3. 鋪貼壁磚，300x600mm

4. 鋪地磚，300x300mm



5. 地坪水泥砂漿打底抵石子



6. 坐式馬桶，落地式，含配件



7. 新設加長型蹲式馬桶配件全及大捲筒衛生紙架及廁間增加置物板(25*25cm 半圓)



8. 小便器，掛牆式，電動沖水閥，含配件及大捲筒衛生紙架廁間及增加置物板(25*25cm 半圓)



9. 馬槽型人造石洗手台(下方安裝水龍頭)及自動龍頭

10. 拖布盆，陶瓷，含配件



11. 無障礙小便斗扶手

12. 給皂機，自動式



13. 沖洗器

14. 新設搗擺隔間(含安裝固定)



15. 浴廁強化美耐板隔間，小便斗隔板

16. 廁間衣物掛勾



17. 鋁窗外新設固展鋁花格網

18. 天花板，明架，矽酸鈣板，輕鋼架及照明燈具-15w 以上 LED 崁燈(15cm) 及排風扇及輕鋼架循環扇



19. 嵌入單切開關


20. 接地型雙聯插座(附防滴蓋板)




21. 新設明鏡



22. 新設緊急求救鈴按鈕

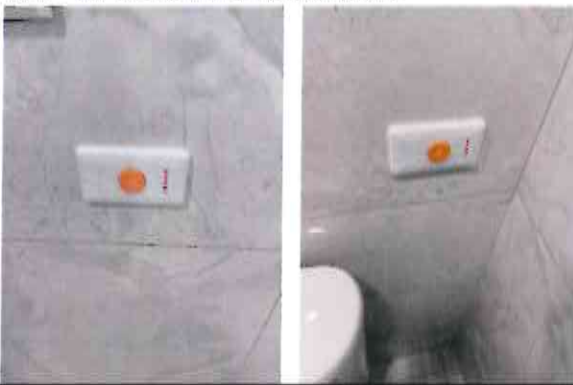

23. 門片標示牌(卡點西德)

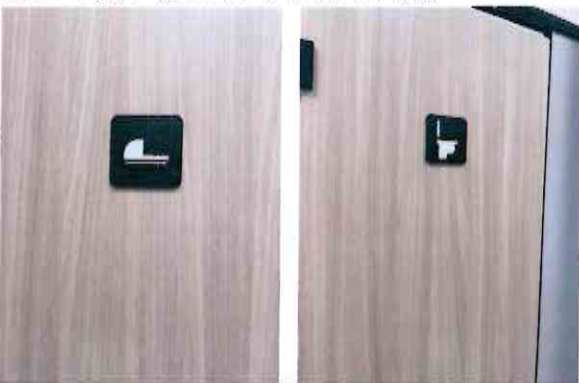

24. 不銹鋼排水口



25. 管道間蓋板更新(塑鋼門)



頂樓給水閥更新

